



SITUACIÓN EDILICIA DE ALGUNOS LICEOS DE MONTEVIDEO AL 5 DE MARZO

LICEO 13




- No se ha realizado ninguna obra; la empresa constructora ha llevado parte de la maquinaria.
- El viernes 22 se colocó en la puerta un cartel de la Corporación Nacional para el Desarrollo.
- Se supone que las obras, que insumirán varios meses, comenzarán en la semana del 4 de marzo.
- La obra comenzaría con refacciones en el segundo piso del edificio (incluidos techos y cielorrasos).
- No existe plan de contingencia para que las clases se puedan desarrollar junto con las obras (entre otros aspectos, la normativa exige a la empresa constructora la "delimitación de la obra", impidiendo el ingreso a la zona de trabajo por parte de personas ajenas a la obra -en este caso, estudiantes, docentes y funcionarios-).
- **El 4 de marzo el CES TUVO reunión con la empresa constructora para acordar un plan de contingencia.**
- **Aún no comenzaron las clases.**

LICEO 14




- Los salones del patio, con techo liviano, fueron pintados pero siguen sin cielorraso.
- Los baños del patio, que estaban clausurados y muy sucios, fueron limpiados **y se destaparon las cañerías obstruidas.**
- Persiste el problema de plaga de palomas.
- La casona que da a 8 de Octubre, con importantes problemas de humedad, no fue impermeabilizada.
- En el local principal (edificio de tres plantas sobre José Batlle y Ordóñez) se realizaron trabajos de impermeabilización (ignoramos si total o parcial), pintura y limpieza.
- **Parte de un cerramiento cayó hoy a la acera sobre José Batlle y Ordóñez.**
- El 1º de marzo, a última hora de la tarde, el mobiliario de todos los salones del local principal se encontraba apilado en los corredores.
- Trabajó en la institución una cuadrilla del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
- **El 4 de marzo se dio la bienvenida a los primeros años.**

LICEO 17

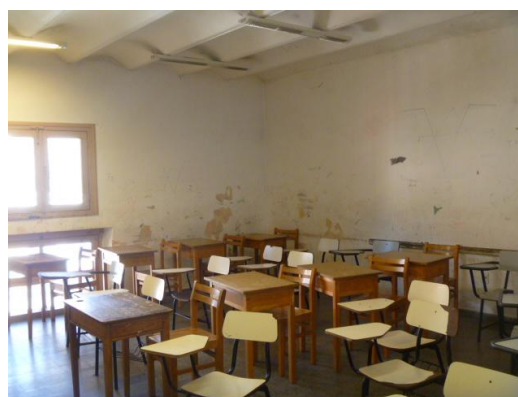

- **En 2012 se demolió el antiguo local, en Fernández Crespo, y se trasladó a la Escuela España, en 18 de Julio y Paullier.**
- **La empresa había establecido 15 meses para la construcción, pero no podrá cumplir con ese plazo.**
- **La Escuela España presenta humedades en salones y corredores.**
- **No hay funcionario de biblioteca en el turno nocturno.**
- **Aunque los horarios de clase no estaban terminados, el 4 de marzo se dio la bienvenida a los primeros años.**

LICEO 18

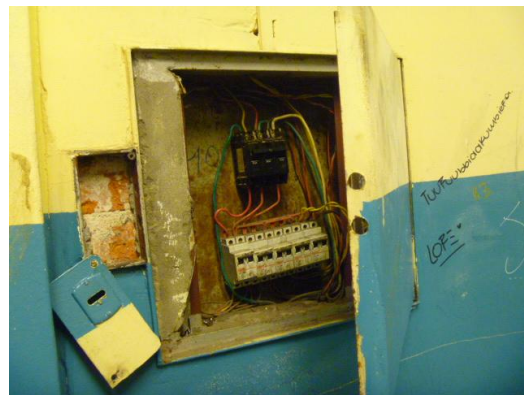

→ En el verano se hicieron algunos arreglos en la instalación eléctrica (cambios de tubo luz).

- Las obras de la CND debían comenzar el 28 de enero y terminar el 28 de marzo, pero aún no comenzaron.
- El 27 de febrero se colocó un cartel de obra de la Corporación Nacional para el Desarrollo.
- Se supone que las obras podrían comenzar el 11 de marzo.
- La obra de la CND no comprende reparaciones en el gimnasio, que se encuentra inutilizable. El CES se haría cargo de su reparación, pero aún ni siquiera se presupuestó.
- El archivo continúa clausurado.
- No existe plan de contingencia para que las clases se puedan desarrollar junto con las obras (existe una única entrada y salida).
- Se perdió un cargo de adscripción en el turno vespertino, por lo que tres adscriptos tienen a su cargo 16 grupos.
- Los funcionarios de servicio son insuficientes para las dimensiones del local.
- No hay salón de usos múltiples.
- No se sabe dónde se hará educación física, ya que el CES no ha pagado aún al club que se alquiló el año pasado.
- La sala docente se realizó el jueves 28 de febrero, pero no estaban prontos los horarios de clase.
- Aunque los horarios de clase no estaban terminados, el 4 de marzo se dio la bienvenida a los primeros años.

LICEO 19



- Cuando visitamos el local el 25 de febrero, 4 salones, la biblioteca y el laboratorio de química estaban inundados debido a la lluvia del domingo 24.
- El 1º de marzo se colocó membrana asfáltica en las uniones de algunas de las chapas del techo del local. Los compañeros docentes que estaban presentes denunciaron que los "parches" realizados distan enormemente de ser los necesarios como para terminar con las filtraciones de agua los días de lluvia. Además de que la impermeabilización realizada es muy insuficiente, no se contemplaron las filtraciones a través de los marcos de las ventanas, muchas de las cuales muestran un acentuado deterioro.
- Los profesores tenían razón: los salones se volvieron a inundar tras las lluvias de 2 y 3 de marzo.
- Las obras para el cambio total de los techos aún no se han presupuestado.
- Una cuadrilla numerosa realizó una limpieza profunda de corredores y salones, así como de los patios ubicados a la entrada del liceo.
- Sigue habiendo muchas horas vacantes.
- El 4 de marzo se dio la bienvenida a los primeros años.




- Aún no se ha realizado el cambio de los techos livianos. **Provisoriamente se arregló el cielorraso de los salones externos. Los nuevos techos se importan y llegarán en un mes.**
- **Las reparaciones en la instalación eléctrica finalizarán recién el miércoles 6 o el jueves 7.**
- Se pintó el local.
- Se lustraron y plastificaron pisos de parquet.
- Se pintaron bancos, actividad que se le ordenó realizar a los funcionarios de limpieza.
- Se redistribuyeron espacios. La dirección será salón de clases. La administración funcionará como archivo. Uno de los salones se dividió para funcionar como dirección y secretaría.
- **El plan era que la antigua sala de informática se dividiera con un tabique dando espacio a una diminuta sala de profesores. El plan se modificó y la sala de profesores permanecerá en su antigua ubicación.**
- **El equipo multidisciplinario comparte salón con el archivo.**
- **No hay conectividad en dirección.**
- **No cuenta con Profesor Orientador Bibliográfico.**
- **El 4 de marzo se dio la bienvenida a los primeros años.**



- Trabaja en la institución una cuadrilla del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
- Se cubrió la humedad con placas que fueron pintadas y colocadas en los lugares más comprometidos.
- Se realizó pintura en todo el local.
- Cambio de baldosas rotas del piso.
- Cambio de tubo luz sin sujeción mecánica.
- No se resolvió tema de aislación en el techo y ventilación del local.
- El altillo donde funciona la biblioteca fue pintado **e impermeabilizado**, pero continúa con humedades, falta de ventilación, etc.
- **También se impermeabilizó la cantina.**
- El mobiliario de los salones se encuentra apilado en corredores y el pequeño patio del fondo.
- **Funcionan ocho grupos por turno de entre 30 y 34 estudiantes en salones medianos; siguen llegando inscripciones.**
- **El liceo no cuenta con asistente social.**
- Los docentes fueron citados a sala el lunes 4 de marzo en el local del liceo 47.
- **Está previsto que las clases de los primeros y segundos se inicien el miércoles 6 de marzo.**

ANEXO LICEO 22

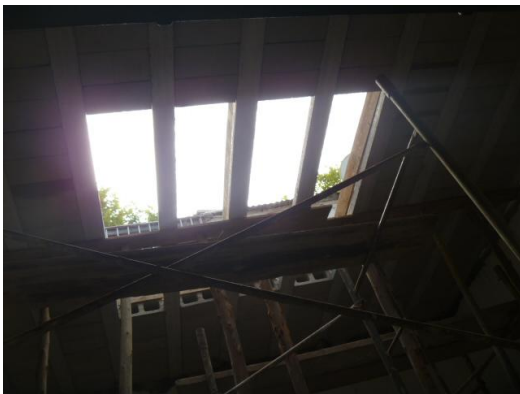

- **Comenzó a cerrarse el salón que se encontraba sin techo.**
- Los demás salones continúan en las mismas condiciones en que finalizaron las clases.
- **Resulta poco probable que el local esté pronto para recibir estudiantes antes de dos semanas.**
- **Está previsto que las clases de los terceros se inicien el viernes 8 o el lunes 11 de marzo.**

LICEO 24

- **En la sala de informática, cuando llueve el agua se filtra sobre los toma corriente a través de las ventanas.**
- **Sólo hay laboratorista en el turno matutino (no tarde, no noche).**
- **No hay funcionario para la biblioteca.**
- **La sala docente para entregar los horarios de clase a los profesores será el miércoles 6.**
- **Aún no comenzaron las clases.**




- Edificio que tiene orden de derrumbe.
- **La construcción del nuevo local debió comenzar en enero, pero aún no lo ha hecho.**
- Al momento continúa con espacios inhabilitados.
- Solamente se realizó pintura en todo el local, encima de las humedades, que no fueron atacadas.
- **Baños de profesores y estudiantes varones en mal estado y con mal olor.**
- **La sala de informática no tiene conectividad.**
- **El 4 de marzo se dio la bienvenida a los primeros años.**

LICEO 31



- En setiembre de 2012, un temporal voló los techos de cinco salones (3 de clase, la biblioteca y una adscripción), dañando los techos de otros cinco salones (quedaron muy dañados y con quebraduras).
- Además, se vio afectada la instalación eléctrica de esos diez salones, y hay que hacerla a nuevo.
- La empresa constructora que se encuentra trabajando ha presentado techos nuevos en los salones que los habían perdido, faltando aún algunos detalles.
- Se está trabajando en la instalación eléctrica, pero las obras no han finalizado.
- No está prevista la refacción de los techos dañados antes del comienzo de clases, y eso preocupa a los docentes, porque se produjeron filtraciones de agua con las últimas lluvias.
- El 4 de marzo se descargaron baños químicos para los obreros, así como vallas para delimitar la zona de obra y que las clases se puedan desarrollar junto con los trabajos (en los techos dañados).
- Los docentes están cumpliendo sus horarios de trabajo, desarrollando tareas de planificación, reorganización de la biblioteca y acondicionamiento de la sala de profesores.
- A mediano plazo deben atenderse otros problemas que presenta el local, a saber: filtraciones de agua por el techo de la parte más antigua del liceo (donde también hubo filtraciones de agua con las últimas lluvias), instalaciones sanitarias en los baños, instalaciones eléctricas en diferentes lugares del establecimiento y local destinado a los funcionarios de servicio.
- Las clases de primer año se inician el miércoles 6 de marzo.
- Actividad de bienvenida a segundos y terceros: viernes 8 de marzo, dos horas de clase por turno.
- Viernes 8 de marzo: asamblea docente para evaluar el avance de las obras.
- Si existen condiciones, las clases de segundo y tercer año se iniciarían el lunes 11 de marzo.

LICEO 33

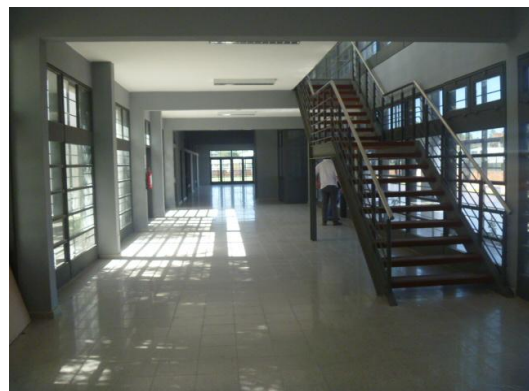

- Local a estrenar en excelentes condiciones.
- El técnico prevencionista de nuestro sindicato destaca el trabajo de planificación de las obras.
- Tomamos conocimiento de que el plano original preveía más salones de los que tiene el local, y ello debió modificarse ya que se perdió litigio con vecino que ocupa terreno lindero.
- **El mobiliario de los salones de clase fue colocado en su lugar.**
- **El resto del mobiliario será ubicado en el correr de las siguientes semanas (administración, biblioteca, etc.).**
- **El 4 de marzo se dio la bienvenida a los primeros años.**



LICEO 37



- Funcionará en un local arrendado en el edificio del colegio "Domingo Savio".
- Se construyó entrada independiente por la calle del fondo.
- El camino de ingreso al liceo fue separado con un gran muro del patio que usa el colegio.
- Para acceder a la planta que ocupará el liceo deben subirse 65 escalones.
- La construcción es buena y muy amplia.
- El local estaba abandonado, pero se le arregló toda la parte eléctrica y la pintura.
- La obra finalizó el 1º de marzo, y llaman la atención algunas humedades en el techo del corredor principal.
- Necesitan reparación las bisagras de muchas de las grandes ventanas de los salones.
- **Los materiales de los laboratorios no fueron mudados aún.**
- **La entrada por Vasconcellos da a una zona poco iluminada, en un entorno poco poblado, y está lejos de las paradas de los ómnibus que pasan por allí (102 y 195), y eso se convierte en un problema particularmente a primeras horas de la mañana y en el turno nocturno. Los docentes solicitan se realice una nueva entrada sobre la calle Osvaldo Cruz.**
- **El liceo no cuenta en la puerta de entrada con personal permanente que conozca a los estudiantes y controle el ingreso de personas ajenas a la institución.**
- **Resulta insuficiente la cantidad de bancos por salón para la cantidad de estudiantes inscriptos en cada grupo.**
- **Los grupos de primer año están superpoblados: 37 estudiantes.**
- **Se nos informa que la línea telefónica no estará pronta hasta fines de marzo (local incomunicado).**
- **Existe riesgo de accidentes por falta de rejas en los ventanales (segundo piso) y por falta de baranda en la escalera que conduce a la biblioteca.**
- **La sala de informática no tendrá conectividad hasta -por lo menos- abril.**
- **No hay empresa responsable de la cantina, lo que supone un problema muy grande para un local del que se tarda varios minutos en salir.**

- Aún en estas condiciones, el CES presionó para comenzar las clases el jueves 7.
- La sala docente realizada el lunes 4 de marzo resolvió no comenzar el día 7. Ese día irán al liceo a recibir a los padres, mostrarles las instalaciones y dialogar con ellos.
- Aún no comenzaron las clases.

LICEO 39

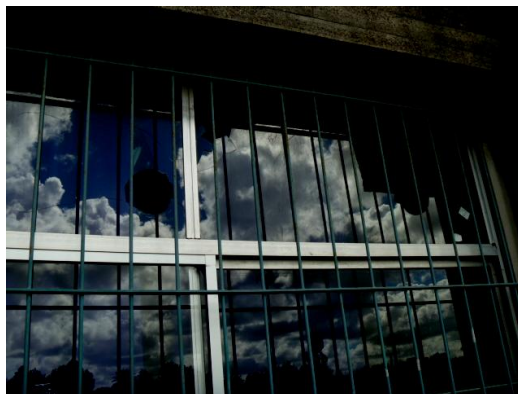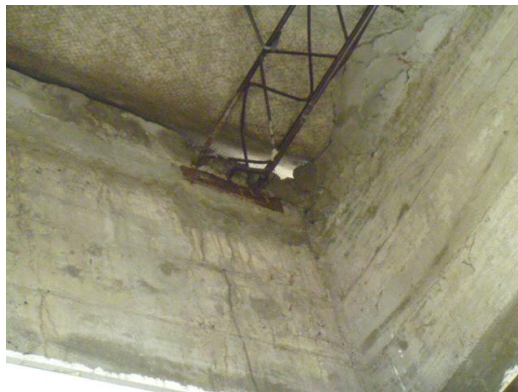

- Muchos salones filtran agua a través del techo cuando llueve.
- El cielorraso está muy deteriorado y falta en diversas partes de la institución.
- El contenedor ubicado al fondo filtra agua por las uniones y carece de aire acondicionado para repeler los excesivos fríos y calores que se generan en su interior.
- La cancha donde se realizaba educación física dejó de ser utilizada por encontrarse contigua al contenedor, ya que cualquier ruido impide el desarrollo de la clase en su interior.
- Los docentes de la institución solicitaron la construcción de nuevas aulas, pero se contestó negativamente.

- Se están colocando los pilares para colocar tres nuevos contenedores.
- El espacio reservado a biblioteca es muy pequeño, por lo que no existe sala de lectura.
- El salón multiuso es usado como salón de clase en el turno nocturno, por lo que no puede ser usado para su fin en ninguno de los turnos.
- Los grupos rondan los 40 estudiantes por grupo.
- No cuenta con subdirectora, ni con psicóloga institucional, ni con profesor orientador pedagógico.
- Falta un adscripto en el turno vespertino.
- El 4 de marzo se dio la bienvenida a los primeros años.

LICEO 43



- Se sigue en iguales condiciones que en diciembre de 2012.
- La construcción del nuevo local no ha empezado. El retraso en el inicio de las obras se debe a un error en los planos presentados ante la IMM (estaba mal hecho el retiro a la calle, la altura y los desagües).
- Los nuevos planos los realizaría PAEMFE.
- La empresa encargada de realizar las obras es Diesti y Montañés, **y presentaría el proyecto a la comunidad en abril.**
- **Ingresan humedades en sala de informática y salón de clase a través de picaduras hechas el año pasado que quedaron inconclusas por resolución del CES. Los funcionarios de servicio limpiaron y pintaron las paredes en las que había moho.**
- **880 inscriptos, en once grupos por turno (promedio matemático: 40 estudiantes por grupo).**
- **Cada adscripto tiene a su cargo un promedio de 120 estudiantes.**
- **Se pide la creación de un cargo de adscripción más en cada turno.**
- **El liceo cuenta sólo con tres funcionarios de servicio para ambos turnos.**
- **No hay Profesor Orientador Bibliográfico.**

- No hay equipo multidisciplinario: sólo se cuenta con una psicóloga para la totalidad de los estudiantes.
- No se atendió solicitud de limpieza del predio contiguo.
- Escolares comparten instalaciones del liceo por algunos días mientras se realizan obras en escuela.
- El 4 de marzo se dio la bienvenida a los primeros años.

LICEO 44



- Una empresa contratada por la Corporación Nacional para el desarrollo comenzó obras el 26 de febrero.

- Se trabaja en el acondicionamiento del baño para docentes.
- Aún no comenzaron las obras de impermeabilización de la azotea, canaleta para desagüe en el patio y pintura para todo el local.
- Se perdió un salón de clase que fue devuelto al Consejo de Educación Inicial y Primaria.
- El laboratorio estaba siendo usado como salón de clase.
- El contenedor que oficiaba de salón de clase, que tenía filtraciones de agua, fue retirado.
- Se colocó un nuevo contenedor.
- Los dos contenedores prometidos, uno para salón de clase y otro probablemente para la biblioteca, no han llegado aún.
- Llegó una batería de baños prefabricados, y se está trabajando en su instalación sanitaria.
- Se están limpiando los salones existentes.
- Hoy se cuenta con un único baño para toda la institución, y para acceder a él hay que saltar por encima de una gran cámara sin tapa.
- Una gran cantidad de bancos se encuentran apilados en diferentes sectores del patio.
- Aún así, las autoridades pretendían comenzar las clases el 4 de marzo.
- Las clases no comienzan antes del lunes 11 de marzo.

LICEO 45



- Una empresa trabajó en el local cerca de seis meses, dejando el local en buenas condiciones.
- La impermeabilización realizada (el problema principal eran las filtraciones de agua) resistió las últimas lluvias.
- Se cambiaron, refaccionaron y pintaron las puertas de los salones.
- Se habilitaron los baños de la planta baja clausurados durante la obra.
- Presenta señalización de salida, luz de emergencia, etc.
- Los bomberitos están en correctas condiciones: precinto, carga, ubicación.
- No es adecuado el lugar para los funcionarios (espacio de un metro veinte de altura, debajo de una escalera).
- El 4 de marzo se dio la bienvenida a los primeros años.

LICEO 48



- La impermeabilización realizada resistió las últimas lluvias.
- Se encuentran tapando las entradas de las abejas.
- **Baños de planta superior siguen clausurados. La empresa encargada de repararlos debe terminar primero obras en otros liceos.**
- Las clases de PIU funcionarán en el piso superior, en un "cubículo" de madera.
- Los ex salones del PIU siguen lloviéndose, se inundan desde el patio, y tienen aún ventanas fijas.
- La dirección plantea que un cargo de adscripción de la mañana lo pasaron para el vespertino, pero evalúan que es necesario en el turno de la mañana, y que necesitarían por lo menos 1 funcionario más de limpieza.
- **Los grupos de tercer año rondan los 38 estudiantes.**
- **El 4 de marzo se dio la bienvenida a los primeros años.**


LICEO 62




- Las obras, que deberían haber comenzado el 28 de enero, **lo hicieron recién el 27 de febrero.**
- **Las obras, que en principio se iban a extender hasta agosto, lo harán ahora hasta octubre.**
- La empresa encargada de realizar las obras es FABRA.
- **Se está trabajando en el cambio de chapas corroídas y la limpieza de la azotea. Se supone que, destapando los desagües, dejarían de lloverse los salones.**
- **Se colocó un tejido para separar la obra de la cancha del liceo.**
- **No se realizó la impermeabilización de azotea y juntas de dilatación.**

- No se repararon los salones para PIU.
- No se cambiaron las aberturas que están en mal estado.
- Se mudó la sala de profesores para un salón de clase.
- La empresa realizará tareas de mantenimiento a los baños de los estudiantes.
- El liceo no tiene secretaria (situación histórica) y tiene dos administrativos menos.
- El 22 de febrero llegó una funcionaria del liceo 46, encargada de hacer los horarios.
- Se proyectan 38 alumnos por grupo en los 2os años, 39 en los 3eros y 30 en los 1eros.
- El 4 de marzo se dio la bienvenida a los primeros años.

LICEO 67

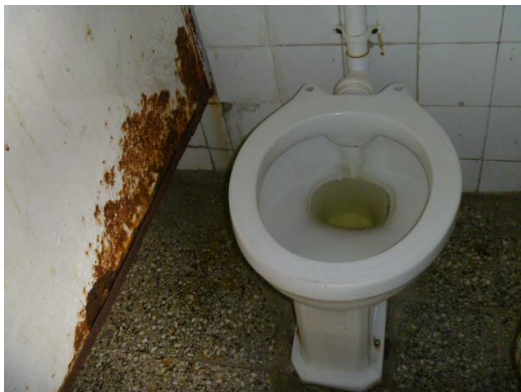

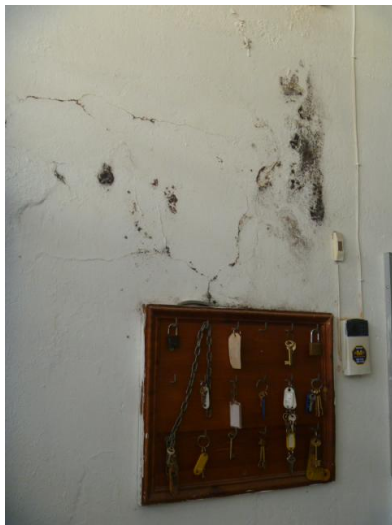

- **Contrariamente a lo informado por las autoridades en la bipartita CES-FENAPES del viernes 1° de marzo, no comenzaron los trabajos de limpieza y pintura.**
- **Las únicas obras que se comenzaron son para instalar un nuevo contenedor.**
- **Como el local es alquilado no se harían otros trabajos.**
- **El CODICEN tiene trabada la construcción de un local nuevo porque estaría atado a la construcción conjunta con formación docente.**
- El resto de los problemas denunciados por ADES Montevideo desde diciembre siguen igual: los contenedores son reducidos para las tareas que en ellos se realizan, faltan baños, servicios sanitarios sin puertas, el contenedor donde funcionan dirección y administración se llueve por la unión del techo, lugar inadecuado para adscripción y PIU, no cuenta con cantina, espacio reducido para biblioteca, salones con poca ventilación e iluminación, escalera de acceso al segundo piso sin pasamanos, sala de profesores reducida y con humedades, paredes de los salones del segundo piso con movimiento, laboratorio que se llueve, sala de informática con humedades, no existe habilitación de bomberos, no hay señalización ni iluminación de emergencia, única entrada y salida.
- **El 4 de marzo se dio la bienvenida a los primeros años.**

LICEO 72



- Liceo de segundo ciclo "creado" en 2012 para solucionar problema de superpoblación en el liceo 61 (único liceo diurno de segundo ciclo en toda la zona oeste de Montevideo).
- Comparte instalaciones con el liceo 11 (patio, gimnasio), de primer ciclo y con una gran matrícula de estudiantes.
- La entrada sigue siendo por terreno contiguo y continúa sin ningún tipo de arreglo (hay escombros). El 5 de marzo el único acceso era a través de un tablón de obra.
- Se cambió una chapa averiada en el techo de la sala que comparten dirección y administración.
- No se impermeabilizó el techo de los salones de clase (el agua se filtra en grandes cantidades cuando llueve), ni del baño de damas (la pintura colocada encima de las humedades comenzó a caerse, mohos en techos y paredes), ni del pasillo de ingreso al local (deteriorado por las humedades).
- El baño de caballeros, en la planta baja, tiene también problemas de humedad que no han sido solucionados.

- Profesores y estudiantes del mismo sexo comparten baños.
- No hay laboratorios (por esta razón, no pueden crearse grupos de las orientaciones biológica y científica).
- Persisten rastros de humedad, ventanas selladas, sala de dibujo sin iluminación natural y escasa ventilación, pisos rotos, administración y dirección con insuficientes tomas de corriente, llave general de electricidad en liceo 11, extintores sin precintos y descargados, no hay señalización ni iluminación de emergencia, única entrada y salida.
- Faltan recursos didácticos: mapas, colchonetas, computadoras.
- No existe un plan de obras.
- Está previsto que las clases se inicien el jueves 7 de marzo (cuartos años).

LICEO 73



- Local a estrenar en excelentes condiciones.
- El liceo tiene 7 grupos en la mañana (3-2-2) y 2 primeros en la tarde. La justificación para esa distribución es que se van a abrir (en breve) cursos de FPB de UTU en la tarde. Supuestamente de Informática.
- Hay 2 adscriptas de mañana y uno de tarde.
- No hay equipamiento en laboratorios, ni en sala de informática, ni en biblioteca. Dice la Dirección que "todo está en camino", supuestamente trancado por algún trámite burocrático.
- Hay dos oficiales de policía que se "integrarían" a la comunidad educativa. Una o dos semanas uniformados y luego sin uniforme. ¿Qué pasa con el protocolo que establece que deben estar fuera?
- El 4 de marzo se dio la bienvenida a los primeros años.

LICEO 74





- Predio alquilado a una cuadra de la Plaza Lezica, con opción a compra.
- Casona con humedades muy importantes; necesita cambio de aberturas (se encuentran en muy mal estado).
- Tres salones al fondo, cancha de básquet en situación de abandono (recuperable), otros salones en avanzado deterioro y un gran predio arbolado.
- **Se colocaron dos contenedores, con veredas en construcción y sin techo de acceso.**
- La batería de baños en condiciones es insuficiente.
- **Los baños prefabricados se están colocando junto a los salones.**
- Al comienzo de clases no tendrán laboratorio ni biblioteca.
- **Los salones de clase y el espacio en el que funcionará la administración serán limpiados en estos días.**
- Sillas y bancos de los salones son nuevos.
- La empresa constructora trabaja en el lugar hace 30 días.
- El proyecto se extiende -al menos- hasta mayo, lo que redundaría en el dictado de clases en obra.
- **Se estaría elaborando plan de contingencia para que las clases se puedan desarrollar junto con las obras.**
- **No se cuenta con administrativos. Las inscripciones se están realizando en el liceo 62, sobrecargando el trabajo de los funcionarios de esa institución.**
- **Sólo se cuenta con una funcionaria de servicio, que trabaja para una empresa contratada.**
- El lunes 4 de marzo se realizará reunión con padres.
- El martes 5 de marzo se realizará "orientación" a primeros, por turno.
- El miércoles 6 de marzo se realizará "orientación" a segundos y terceros, por turno.
- **En medio de este panorama, las autoridades pretenden que las clases comiencen el jueves 7 de marzo.**
